




Strasseninstandsetzung Schlatterstrasse km 5.420 – 6.442

Ausführung April – Juli 2016, Bauzeit 14 Wochen

Bauherrschaft: Baudirektion Kt. ZH, Tiefbauamt Strasseninspektorat UR III
Projekt: Ingesa AG
Bauvolumen ca.: Fr. 1.05 Mio.
Arbeiten: Submission, Bauleitung, QS, Ausmass und Abrechnung

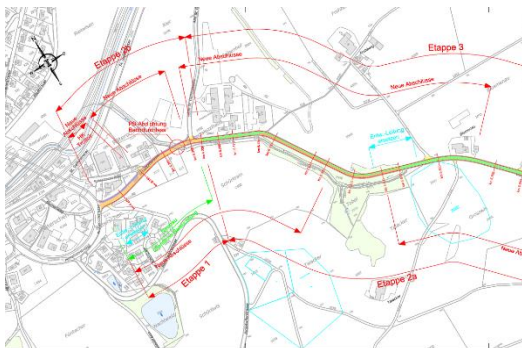

Instandsetzung in 4 Teiletappen unter Verkehr
Teilersatz und Verstärkungen bei Fundationen
Bankettsicherungsmaßnahmen
Abschlüsse, Entwässerungs- und Schachtsanierung
Anpassungen von diversen Einlenk- und Vorplatzbereichen sowie Gehwegen

Gesamt Mengen Fundation ca. 2700 to,
1700m Abschlüssen, 330m Entwässerungs- und Sickerleitungen




Freilegen und Abdichten von Bachdurchlass

Gehwegergänzung als Schulwegsicherung
Ergänzung der öffentlichen Beleuchtung und gesicherten Strassenübergang



Fundationsverstärkung und Bankettsicherung

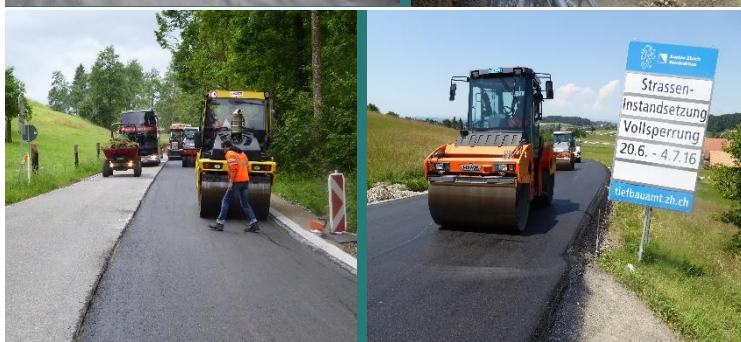

Vorarbeiten unter halbseitiger Verkehrsführung

Zweiwöchige Vollsperrung für Tragschichtenersatz, Einbau von Binder – und Deckschicht
Gesamteinbauten Beläge ca. 2400 to
